N°	LOTS	Nom de la tâche	Durée
1	DELAI	DELAIS TRAVAUX 18 MOIS DONT 2 MOIS DE PREPARATION DE CHANTIER	364 jours
2	PREPA.	PREPARATION DE CHANTIER	40 jours
3		NIVEAU RDC BAS	
4	01	TERRASSEMENT / VRD	20 jours
5	02	GROS OEUVRE	20 jours
6	04	ETANCHEITE DES VOILES ENTERRES	20 jours
7	14	PLOMBERIE	20 jours
8	15	ELECTRICITE	20 jours
9		NIVEAU RDC HAUT	
10	02	GROS OEUVRE	30 jours
11	14	PLOMBERIE	30 jours
12	15	ELECTRICITE	30 jours
13		NIVEAU 01	
14	02	GROS OEUVRE	30 jours
15	14	PLOMBERIE	30 jours
16	15	ELECTRICITE	30 jours
17		NIVEAU 02	
18	02	GROS OEUVRE	30 jours
19	14	PLOMBERIE	30 jours
20	15	ELECTRICITE	30 jours
21		NIVEAU TOITURE	
22	02	GROS OEUVRE	30 jours
23	04	ETANCHEITE DES TOITURES	40 jours
24	14	PLOMBERIE	25 jours
25	15	ELECTRICITE	20 jours
26		ENVELOPPE	
27	03	CHARPENTE / COUVERTURE	40 jours
28	05	FACADE / ISOLATION EXT.	60 jours
29	06	MENUISERIES EXT.	40 jours
30	07	MENUISERIE ACIER / SERRURERIE	30 jours
31		AMENAGEMENT INT. TOUS NIVEAUX	
32	08	DOUBLAGES / CLOISONS (hors d'eau / hors d'air)	40 jours
33	09	MENUISERIES INT.	60 jours
34	10	CARRELAGES / FAIENCES	40 jours
35	11	SOLS SOUPLES	40 jours
36	12	PLAFONDS SUSPENDUS	40 jours
37	13	PEINTURES	60 jours
38	14	PLOMBERIE COMPRIS ESSAIS ET MISE EN SERVICE	90 jours
39	15	ELECTRICITE COMPRIS ESSAIS ET MISE EN SERVICE	95 jours
40	16	ASCENSEUR (hors d'eau / hors d'air)	20 jours
41		ABORDS EXT.	
42	01	RESEAUX ENTERRES SECS ET HUMIDES	30 jours
43	01	REGLAGES PLATEFORMES	10 jours
44	01	BORDURES	10 jours
45	01	ENROBES	5 jours
46	01	CLOTURES	15 jours
47	01	LUMINAIRES / ESPACES VERTS / SIGNALETIQUES	10 jours
48		ADMINISTRATIF	
49	ADM	DEMARCHES ET INSTRUCTIONS CONCESSIONNAIRES	60 jours
50	14 / 15	QUALIGAZ / CONSUEL	10 jours
51	14 /15	MISES EN SERVICE	3 jours
52	SDIS	COMMISSIONS DE SECURITE	1 jour
53	MO / MOE	OPR ET LEVEE DES DESORDRES (comprend les nettoyages)	23 jours
54	MO / MOE	LIVRAISON DES MARCHES	1 jour

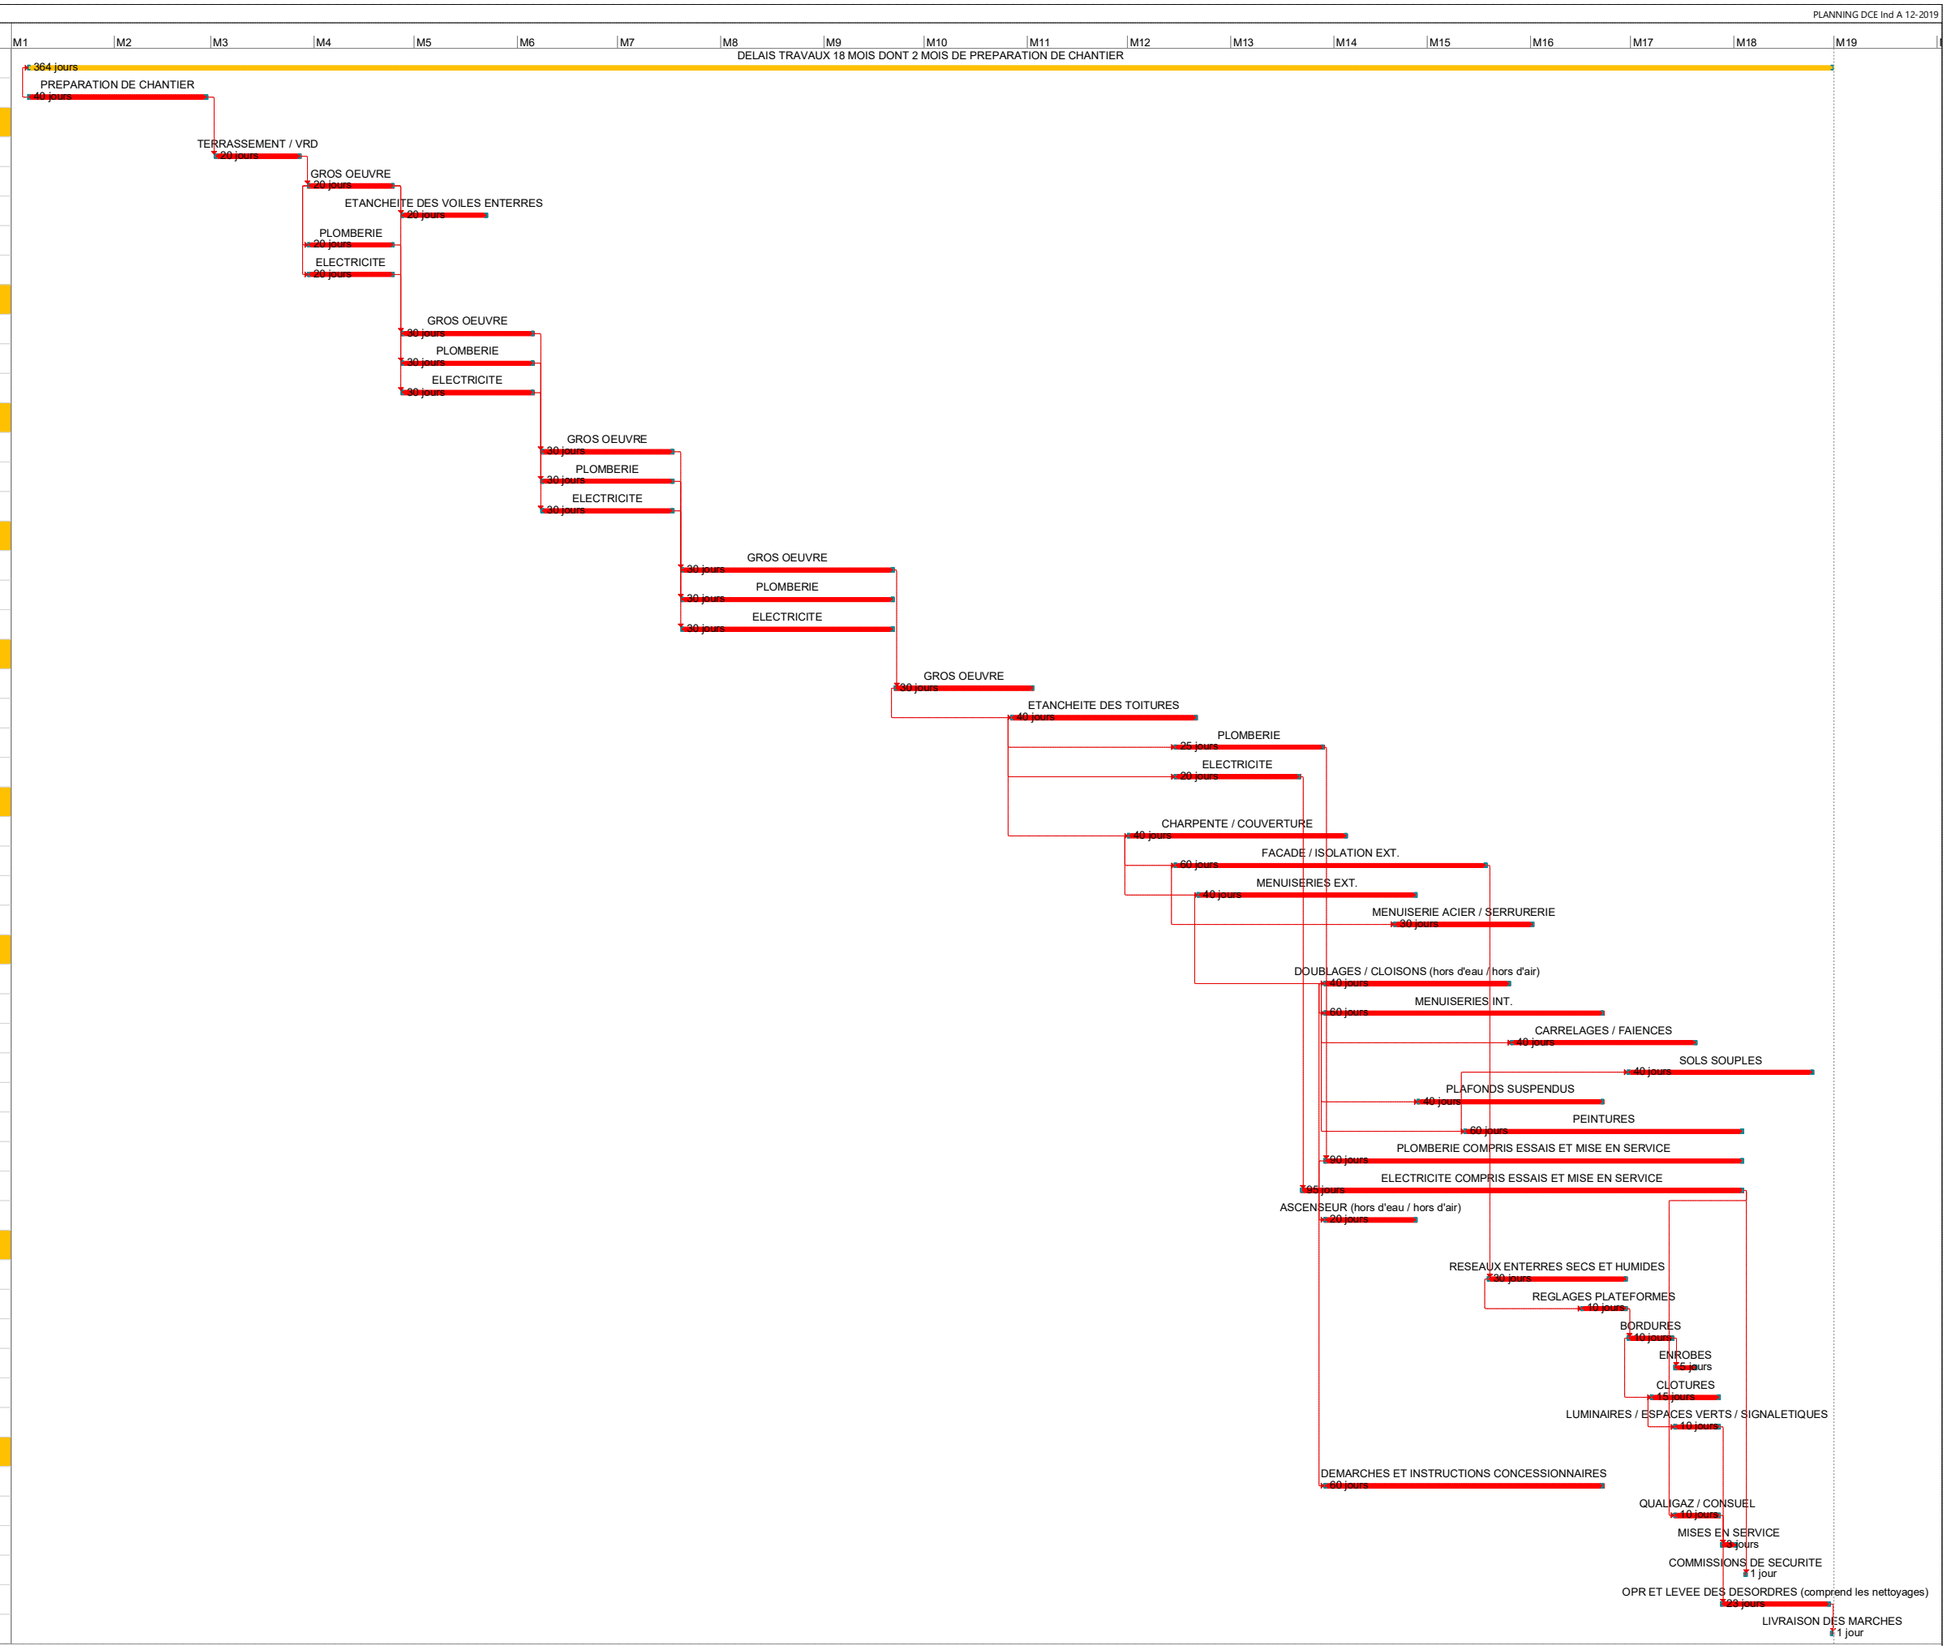

Propriété exclusive : S. GAILLARD
